



P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106
www.norcold.com

Tech support phone: 1.800.444.7210
Tech support fax: 734.769.2332

NORCOLD SIDE VENT

No cooling check sheet

INCOMPLETE INFORMATION WILL BE RETURNED. PLEASE FILL OUT THE FORM CAREFULLY AND INCLUDE PHOTOS SHOWING VENTING!

Dealer name _____ Dealer phone # _____
Refrigerator Model # _____ Refrigerator serial # _____ Date of Testing _____

STEP 1. INCLUDE PHOTOS:

As a side vented unit, the top vent cover should be pulled off and 4 pictures taken, all strictly at the back of the refrigerator, from the top vent:

1. A picture of the top of the refrigerator.
2. A picture of the bottom edge of the fins.
3. A picture taken further back from the vent opening so we can see where the fins sit in relation to the opening.
4. A picture of the backside of the vent cover.


NOTICE

When sending the information back to us, please be sure to include both the completed vent sheet and the pictures requested, otherwise, warranty process will be seriously delayed.


STEP 2. ACTIVATE BOS: 1) Turn to highest temp setting. 2) Unplug thermistor at light connection.

Run refrigerator on highest setting with thermistor disconnected for 6 HR: TEMPS in FRZ: FF:
Temperature setting: Thermistor connected? **YES or NO**
AC heating element: AMP draws: Ohm Reading: AC Voltage:
Diagnostic mode reading on SCREEN 3: Fans running? **YES or NO**
Any frost or moisture on the vertical tube coming out the top of the ABSORBER TANK? **YES or NO**
Any signs of soft spots, water stains/streaks on the back of the unit? **YES or NO** Ambient temp:

STEP 3. WRITE DIMENSIONS IN INCHES.

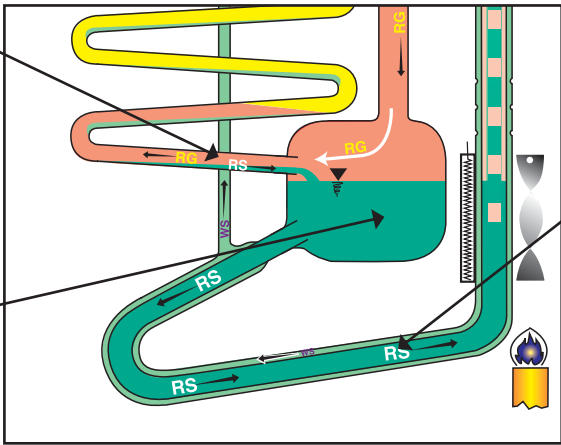Take temperature at the horizontal tube 6" inches from the tank _____ After 8 hours in BOS		Temperature of the tube inserted into burner box: _____ After 8 hours in BOS
Take temperature below center line of the tank _____ After 8 hours in BOS		

STEP 4. WRITE DIMENSIONS IN INCHES. COMPLETE ALL SPECS: A - E.

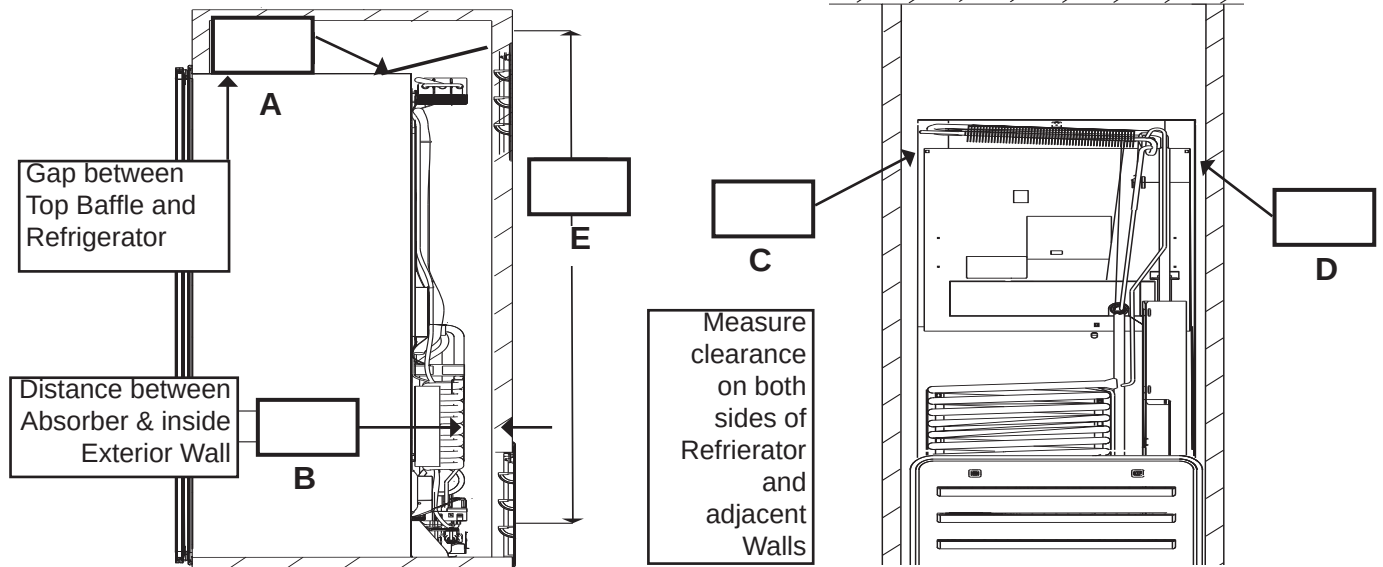



P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106
www.norcold.com

ÉVÉNT LATÉRAL NORCOLD

Vérification pour absence de climatisation

Téléphone du soutien technique : 1.800.444.7210

Télécopieur du soutien technique : 734.769.2332

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET SERA RETOURNÉ. VEUILLEZ LE REMPLIR AVEC SOIN ET JOINDRE DES PHOTOS DE LA VENTILATION!

Nom du détaillant _____ N° de téléphone du détaillant _____

N° de modèle du réfrigérateur _____ N° de série du réfrigérateur _____ Date du test _____

ÉTAPE 1. JOINDRE DES PHOTOS :

Pour l'unité à ventilation latérale, retirer le couvercle de l'événement du haut et prendre 4 photos, toutes à l'arrière du réfrigérateur, depuis l'événement du haut.

1. Une photo du dessus du réfrigérateur.
2. Une photo du rebord inférieur des ailettes.
3. Une photo prise un peu plus à l'arrière de l'événement afin de montrer l'endroit où les ailettes s'appuient par rapport à l'ouverture.
4. Une photo de l'endos du couvercle de l'événement.

AVIS

Au moment de nous envoyer ces informations, prenez soin d'inclure la feuille de l'événement dûment remplie ainsi que les photos demandées, sans quoi le traitement de la demande de garantie sera grandement ralenti.

ÉTAPE 2. ACTIVER LE SYSTÈME AUXILIAIRE DE FONCTIONNEMENT :

1) Choisir le réglage de temp. le plus élevé. 2) Débrancher la thermistance de la connexion de l'éclairage.

Faire fonctionner le réfrigérateur au réglage le plus élevé avec la thermistance déconnectée pdt 6 heures :

TEMP. du CONGÉL. : ALIM. FRAIS :

Réglage de température : Thermistance branchée? **OUI ou NON**

Élément chauffant c.a. : Appel de courant : Résistance : Tension c.a. :

Lecture du mode diagnostic sur l'ÉCRAN 3 : Ventilateurs en marche? **OUI ou NON**

Présence de gel sur le tube vertical sortant du RÉSERVOIR D'ABSORPTION? **OUI ou NON**

Signes de points faibles ou de taches/traces d'eau sur l'arrière de l'appareil? **OUI ou NON** Température ambiante :


ÉTAPE 3. INSCRIRE LES DIMENSIONS EN POUCHES.

Noter la température au tube horizontal à 6 pouces (15 cm) du réservoir

Après 8 heures avec le syst. aux. de fonc.

Noter la température sous la ligne centrale du réservoir


Après 8 heures avec le syst. aux. de fonc.

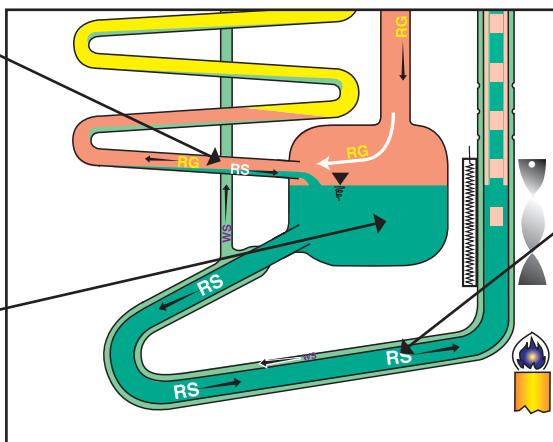

Température du tube inséré dans le boîtier du brûleur :

Après 8 heures avec le syst. aux. de fonc.

ÉTAPE 4. INSCRIRE LES DIMENSIONS EN POUCHES. INDIQUER TOUTES LES DIMENSIONS : A - E.

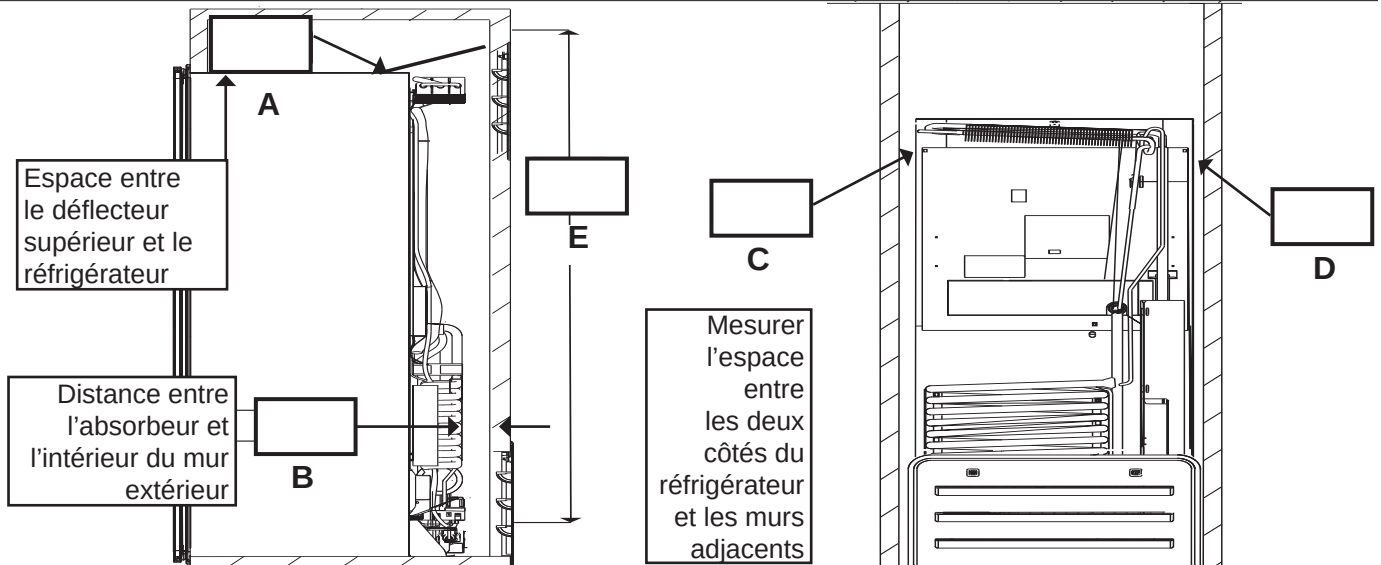



P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106
www.norcold.com

TOMA DE VENTILACIÓN LATERAL NORCOLD

Falta de enfriamiento: lista de verificación

Teléfono del depto. de soporte técnico: 1.800.444.7210
Fax del depto. de soporte técnico: 734.769.2332

SE DEVOLVERÁ SI LA INFORMACIÓN ESTÁ INCOMPLETA. ¡LLENE DETENIDAMENTE EL FORMULARIO E INCLUYA FOTOS DONDE SE MUESTRE LA VENTILACIÓN!

Nombre del distribuidor _____ Teléfono del distribuidor _____ Modelo del
refrigerador _____ N.º de serie del refrigerador _____ Fecha de la prueba _____

PASO 1. INCLUYA FOTOS:

Dado que es una unidad con ventilación lateral, quite la tapa de la ventilación superior y tome 4 fotografías, todas estrictamente en la parte posterior del refrigerador, desde la toma superior.

1. Una fotografía de la parte superior del refrigerador.
2. Una fotografía del borde inferior de las aletas.
3. Una fotografía tomada desde cierta distancia de la toma superior, para que podamos ver la ubicación de las aletas en relación con la abertura.
4. Una fotografía de la parte posterior de la tapa de la toma de ventilación.

AVISO

Al enviarnos la información, no se olvide de llenar e incluir el formulario de tomas de ventilación y también las fotografías solicitadas; de no hacerlo así, habrá una demora considerable del proceso de la garantía.

PASO 2. ACTIVE EL SISTEMA DE RESERVA:

1) Seleccione el mayor ajuste de temperatura. 2) Desconecte el termistor en la conexión de luz.

Ponga a funcionar el refrigerador en el ajuste máximo, con el termistor desconectado por 6 horas.

Temp. congelador: Alim. frescos:

Ajuste de temperatura: ¿Se conectó el termistor? **SÍ o NO**

Elemento calefactor de CA: Amperaje: Valor de ohmios: Voltaje de CA:

Valor del modo de diagnóstico, en la PANTALLA 3: ¿Funcionan los ventiladores? **SÍ o NO**

¿Hay escarcha o humedad en el tubo vertical que sale de la parte superior del TANQUE DEL ABSORBEDOR? **SÍ o NO**

¿Hay signos de zonas blandas, manchas o vetas de agua en la parte posterior de la unidad? **SÍ o NO** Temp. ambiente:


PASO 3. ESCRIBA LAS DIMENSIONES EN PULGADAS.

Mida la temperatura en el tubo horizontal, a 6 pulg. (15 cm) del tanque

Tras 8 horas con el sistema de reserva

Mida la temperatura por debajo de la línea central del tanque

Tras 8 horas con el sistema de reserva

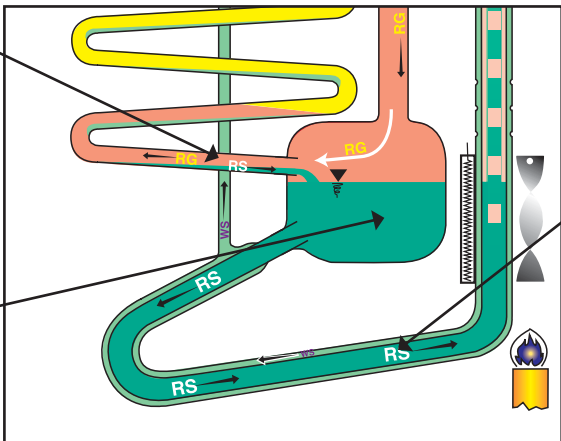

Temperatura del tubo insertado en la caja del quemador:

Tras 8 horas con el sistema de reserva

PASO 4. ESCRIBA LAS DIMENSIONES EN PULGADAS. LLENE TODOS LOS CUADROS: A – E.

